

**RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PENGENDALIAN BIAYA
PROYEK MENGGUNAKAN METODE COST AND SCHEDULE
CONTROL SYSTEM CRITERIA (C/S-CSC) PADA PT. SILKAR
NATIONAL KOTA TANGERANG**

Skripsi Sarjana ini diajukan sebagai
salah satu syarat kelulusan pada Program Strata satu (S1)
untuk Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik
Universitas Darma Persada

Oleh

Fajar Muhammad Daffa

2019240033



Jurusan Sistem Informasi

Fakultas Teknik

Universitas Darma Persada

Jakarta

2023

PERSETUJUAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

PERSETUJUAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI


Skripsi Sarjana yang berjudul :


RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PENGENDALIAN BIAYA PROYEK MENGGUNAKAN METODE COST AND SCHEDULE CONTROL SYSTEM CRITERIA (C/S-CSC) PADA PT. SILKAR NATIONAL

Skripsi ini telah **disetujui dan disahkan** serta diizinkan untuk dipresentasikan pada Sidang Tugas Akhir Program Strata Satu (S1) untuk Program Studi Sistem Informasi pada Semester Gasal Tahun Ajaran 2022/2023.

DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN


DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI


Silvana Tumiwa


Mira Febriana S., S.Kom., M.CS
NIDN : 0522027902

KETUA PROGRAM STUDI

SISTEM INFORMASI


Eka Yuni Astuti, S.Kom., MMSI
NIDN: 0301067502

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Skripsi Sarjana yang berjudul :

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PENGENDALIAN BIAYA PROYEK MENGGUNAKAN METODE COST AND SCHEDULE CONTROL SYSTEM CRITERIA (C/S-CSC) PADA PT. SILKAR NATIONAL

Merupakan karya ilmiah yang saya susun dibawah bimbingan Mira Febriana Sesunan,S.Kom.,M.CS. Tidak merupakan jiplakan Skripsi Sarjana atau karya orang lain, sebagian atau seluruhnya dan isinya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Persyaratan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, 8 September 2023



(Fajar Muhammad Daffa)

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

LEMBAR PENGUJI SKRIPSI


Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Fajar Muhammad Daffa
NIM : 2019240033
Program Studi : Sistem Informasi
Judul Skripsi : Rancang Bangun Sistem Informasi Pengendalian Biaya
Proyek Menggunakan Metode Cost And Schedule Control
System Criteria (C/S-CSC) Pada PT. Silkar National


Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh Strata satu (S1) pada Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Darma Persada

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Mira Febriana S, S.Kom, M.Cs ()

Penguji I : Eka Yuni Astuty, S.Kom, M.M.S. ()

Penguji II : Yahya, S.T., M.Kom ()

Penguji III : Eva Novianti, S.Kom, M.M.S.I ()

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 23 Agustus 2023

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA

ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA

ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Darma Persada, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fajar Muhammad Daffa
NIM : 2019240033
Program Studi : Sistem Informasi
Fakultas : Teknik
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Darma Persada **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PENGENDALIAN BIAYA PROYEK MENGGUNAKAN METODE COST AND SCHEDULE CONTROL SYSTEM CRITERIA (C/S-CSC) PADA PT. SILKAR NATIONAL


berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Darma Persada berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 8 September 2023

Yang menyatakan



(Fajar Muhammad Daffa)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Skripsi ini penulis sajikan dalam bentuk buku yang sederhana. Adapun judul Skripsi yang penulis ambil adalah sebagai berikut :

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PENGENDALIAN BIAYA PROYEK MENGGUNAKAN METODE COST AND SCHEDULE CONTROL SYSTEM CRITERIA (C/S-CSC) PADA PT. SILKAR NATIONAL

Tujuan penulisan Skripsi ini dibuat salah satu syarat kelulusan pada Program Strata satu (S1) untuk Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Darma Persada.

Sebagai bahan penulisan diambil berdasarkan hasil penelitian, wawancara, observasi dan beberapa sumber literatur yang mendukung penulisan Skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan dari semua pihak, maka penulisan Skripsi ini tidak akan lancar. Oleh karena itu pada kesempatan ini, izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ade Supriatna, ST.,MT., Selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Darma Persada.
2. Eka Yuni Astuty, S.Kom., MMSI. Selaku Ketua Jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Darma Persada.
3. Mira Febriana Sesunan, S.Kom., M.CS, Selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
4. Dosen di lingkungan Fakultas Teknik, Jurusan Sistem Informasi Universitas Darma Persada
5. Silvana Tumiwa selaku pembimbing lapangan
6. Orang tua dan keluarga tercinta yang tidak pernah lelah memberikan dukungan moral, materil maupun spiritual
7. Rekan - rekan Mahasiswa Sistem Informasi Universitas Darma Persada Angkatan 2019 yang telah memberikan semangat dalam mengerjakan Skripsi

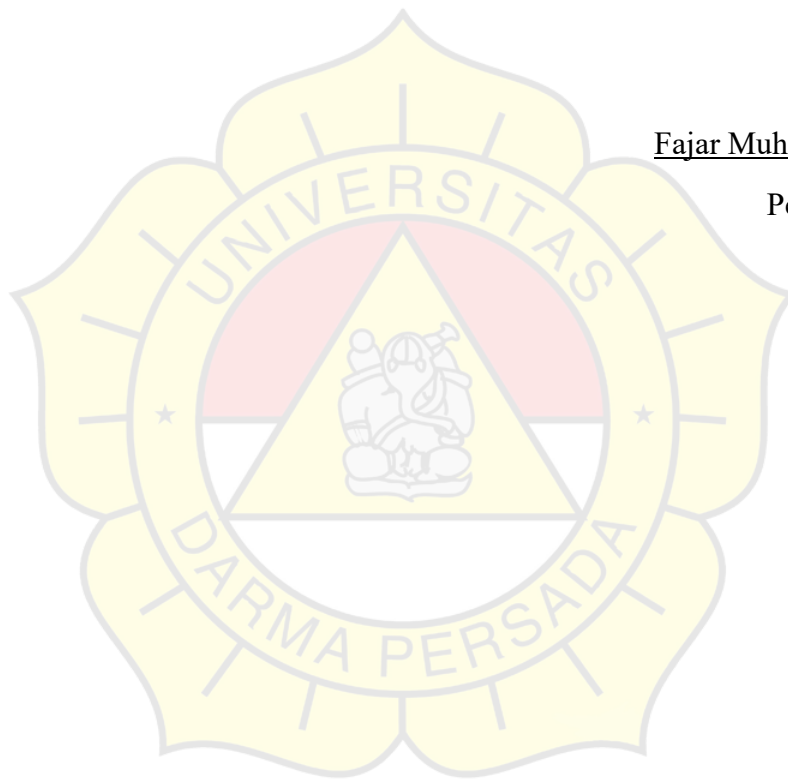
Serta semua pihak yang terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu sehingga terwujudnya penulisan ini. Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh sekali dari sempurna, untuk itu penulis mohon kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang.

Akhir kata semoga Skripsi ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca yang berminat pada umumnya.

Jakarta, 24 Agustus 2023

Fajar Muhammad Daffa

Penulis



ABSTRAK

Proyek merupakan aktifitas yang kompleks yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Ketika proyek telah mulai berjalan, dilakukan pengendalian proyek guna mengetahui kemajuan progres proyek dan mengetahui biaya saat proses berlangsung. PT. Silkar National merupakan perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi, Berdasarkan wawancara yang dilakukan proses pengendalian biaya yang dilakukan terdapat kendala seperti penggunaan biaya yang melebihi rencana anggaran akibat proses pengendalian biaya yang masih belum menggunakan suatu metode yang bisa membantu dalam pengendalian biaya proyek agar biaya yang digunakan tidak melebihi rencana anggaran. Dan pada pembuatan laporan mingguan menggunakan cara manual dengan mengirimkan bon bukti pembelian ke kantor pusat dengan menggunakan ekspedisi yang mana ini membutuhkan waktu dan biaya berlebih pada prosesnya. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti bertujuan untuk menyediakan sistem informasi untuk membantu mengendalikan biaya proyek. Digunakan juga suatu metode yang memadukan biaya dan jadwal untuk membantu dalam mengendalikan biaya. Berdasarkan penelitian tersebut yang berupa sistem pengendalian biaya proyek menggunakan metode C/S(CSC) diharapkan bisa membantu PT. Silkar National dalam mengendalikan biaya proyek dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi saat ini. Sistem yang dibuat nantinya diharapkan dapat membantu agar tidak melebihi rencana anggaran biaya dan memudahkan dalam proses laporan mingguan.

Kata kunci : C/S-CSC, Pengendalian Biaya, Proyek


DAFTAR ISI

PERSETUJUAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI.....	2
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SIMBOL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
1.5 Ruang Lingkup.....	4
1.6 Sistematika Penulisan	4
BAB II LANDASAN TEORI	6
2.1 Konsep Dasar Sistem	6
2.1.1 Karakteristik Sistem	6
2.1.2 Pengertian Informasi	8
2.1.3 Pengertian Sistem Informasi.....	8
2.2 Konsep Dasar Proyek.....	9
2.2.1 Pengendalian Proyek	9
2.2.2 Manajemen Biaya Proyek.....	9
2.3 Cost And Schedule Control System Criteria (C/S-CSC)	11
2.3.1 Pengertian Metode Cost And Schedule Control System Criteria (C/S-CSC).....	11

2.3.2 Analisa Indikator Pada Metode Cost And Schedule Control System Criteria (C/S-CSC).....	11
2.3.3 Analisa Varians	12
2.3.4 Analisa Indeks Performansi.....	13
2.3.5 Manfaat Metode Cost And Schedule Control System Criteria (C/S-CSC)	15
2.4 Peralatan Pendukung Sistem.....	15
2.4.1 Basis Data.....	15
2.4.2 Entity Relationship Diagram	15
2.4.3 MySQL	15
2.4.4 PHP.....	16
2.4.5 HTML.....	16
2.4.6 XAMPP	16
2.4.7 UML (Unified Model Language)	17
2.4.8 Model Diagram UML.....	17
2.5 Metode Pengembangan Perangkat Lunak.....	18
2.5.1 Metode Waterfall	18
2.5.2 Tahapan Metode Waterfall.....	19
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	21
3.1 Kerangka Pemikiran.....	21
3.2 Teknik Pengumpulan Data	22
3.3 Metodologi Pengembangan Sistem.....	23
3.3.1 Tahap Analisis Sistem.....	23
3.3.2 Tahap Desain Sistem	23
3.3.3 Tahap Implementasi Sistem.....	24
3.3.4 Uji Coba Sistem.....	24
3.3.5 Maintenance / Pemeliharaan Sistem.....	24
3.4 Waktu dan Tempat Penelitian.....	24
3.5 Alat dan Bahan Penelitian	25
3.5.1 Alat Penelitian	25
3.5.2 Bahan Penelitian	25
BAB IV IDENTIFIKASI ORGANISASI.....	26






4.1	Tinjauan Organisasi.....	26
4.1.1	Sejarah Perusahaan.....	26
4.1.2	Struktur Organisasi dan Fungsi.....	28
4.2	Analisa sistem.....	36
4.2.1	<i>Use Case Diagram</i> Sistem Yang Berjalan.....	36
4.2.2	Skenario Sistem Yang Berjalan.....	37
4.2.3	Activity Diagram Sistem Yang Berjalan.....	41
4.3	Perancangan Sistem.....	47
4.3.1	Use case Diagram Sistem Usulan.....	47
4.3.2	Skenario Sistem Usulan.....	50
4.3.3	Activity Diagram Sistem Usulan.....	67
4.3.4	Rancang Masukan.....	83
4.3.5	Rancang Keluaran.....	93
4.3.6	Rancangan Basis Data.....	103
4.3	Implementasi Sistem.....	107
4.4.1	Proses Login.....	107
4.4.2	Tampilan Rencana Anggaran.....	109
4.4.3	Tampilan Permintaan Barang.....	111
4.4.4	Tampilan Halaman Laporan Mingguan.....	113
4.4.5	Tampilan Halaman Permintaan Dana.....	115
4.4.6	Tampilan Halaman Purchase Order.....	117
4.4.7	Tampilan Halaman Daftar Harga Barang.....	119
4.4.8	Tampilan Halaman Rencana Anggaran.....	121
4.4.9	Tampilan Halaman Laporan Mingguan.....	123
4.4.10	Tampilan Halaman Permintaan Dana.....	125
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN		127
5.1	Tampilan Aplikasi.....	127
5.1.1	Tampilan Hak Akses Level Logistik.....	127
5.1.2	Tampilan Hak Akses Level Site Manager.....	133
5.1.3	Tampilan Hak Akses Level Project Manager.....	140
5.2	Uji Coba Aplikasi.....	149
5.2.1	Uji Coba Struktural.....	149

5.2.2 Uji Coba Fungsional.....	150
5.2.3 Uji Coba Validasi.....	151
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	152
6.1 Kesimpulan	152
6.2 Saran.....	152
DAFTAR PUSTAKA.....	153
SURAT KETERANGAN RISET	154
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	155
LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI.....	156
LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI.....	157
Lampiran Hasil Wawancara	158
Lampiran A. Dokumen Masukan	159
Lampiran B. Dokumen Keluaran.....	161









DAFTAR SIMBOL

a. Simbol *Use Case Diagram*

NO	GAMBAR	NAMA	KETERANGAN
1		<i>Actor</i>	<i>Actor</i> adalah pengguna sistem. <i>Actor</i> tidak terbatas hanya manusia saja, jika sebuah sistem berkomunikasi dengan aplikasi lain dan membutuhkan <i>input</i> atau memberikan <i>output</i> , maka aplikasi tersebut juga bisa dianggap sebagai <i>actor</i> .
2		<i>Dependency</i>	Hubungan dimana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri (<i>independent</i>) akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya elemen yang tidak mandiri (<i>independent</i>).
3		<i>Association</i>	Asosiasi digunakan untuk menghubungkan <i>actor</i> dengan <i>use case</i> . Asosiasi digambarkan dengan sebuah garis yang menghubungkan antara <i>Actor</i> dengan <i>Use Case</i> .
4		<i>System Boundary</i>	Menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas.
5		<i>Use Case</i>	Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor
6	<<include>>	<i>Include</i>	Melakukan yang harus terpenuhi agar sebuah <i>event</i> dapat terjadi, dimana pada kondisi ini sebuah <i>use case</i> adalah bagian dari <i>use case</i> lainnya.
7	<<extend>>	<i>Extend</i>	Menspesifikasikan bahwa <i>use case</i> target memperluas perilaku dari <i>use case</i> sumber pada suatu titik yang diberikan.

b. Simbol Activity Diagram

NO	GAMBAR	NAMA	KETERANGAN
1		<i>Action</i>	State dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi
2		<i>Initial Node</i>	Bagaimana objek dibentuk atau diawali.
3		<i>Activity Final Node</i>	Bagaimana objek diakhiri
4		<i>Decission</i>	Pilihan untuk mengambil keputusan dan diakhiri kondisi
5		<i>Transition</i>	Sebuah kejadian yang memicu sebuah state objek dengan cara memperbaharui satu atau lebih nilai atributnya



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Kerangka Pemikiran.....	21
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Dan Fungsi	28
Gambar 4. 2 Use Case Diagram Sistem Berjalan	36
Gambar 4. 3 Activity Diagram Berjalan Membuat Rencana Kegiatan.....	41
Gambar 4. 4 Activity Diagram Mengajukan Permintaan Barang	42
Gambar 4. 5 Activity Diagram Mengajukan Permintaan Dana	43
Gambar 4. 6 Activity Diagram Berjalan Membuat Laporan Mingguan	44
Gambar 4. 7 Use Case Diagram Usulan Hak Akses Logistik	47
Gambar 4. 8 Use Case Diagram Usulan Hak Akses Site manager	48
Gambar 4. 9 Use case Diagram Usulan Hak Akses Project Manager.....	49
Gambar 4. 10 Activity Diagram Login Divisi Logistik	67
Gambar 4. 11 Activity Diagram Membuat Dokumen Purchase Order Logistik	68
Gambar 4. 12 Activity Diagram Memproses Permintaan Barang Logistik	69
Gambar 4. 13 Activity Diagram Logout Logistik	70
Gambar 4. 14 Activity Diagram Login Site Manager	71
Gambar 4. 15 Activity Diagram Membuat Rencana Kegiatan Site Manager	72
Gambar 4. 16 Activity Diagram Mengajukan Permintaan Barang Site Manager	73
Gambar 4. 17 Activity Diagram Mengajukan Permintaan Dana	74
Gambar 4. 18 Activity Diagram Membuat Laporan Mingguan Site Manager.....	75
Gambar 4. 19 Activity Diagram Logout Site Manager	76
Gambar 4. 20 Activity Diagram login Project Manager	77
Gambar 4. 21 Activity Diagram Menyetujui Rencana Kegiatan Project Manager.....	78
Gambar 4. 22 Activity Diagram Menerima Laporan Mingguan Project Manager	79
Gambar 4. 23 Activity Diagram Menyetujui Permintaan Dana Project Manager	80
Gambar 4. 24 Activity Diagram Menyetujui Permintaan Barang Project Manager	81
Gambar 4. 25 Activity Diagram Logout Project manager	82
Gambar 4. 26 Rancang Tampilan Halaman Login.....	83
Gambar 4. 27 Rancang Tampilan Halaman Permintaan Dana.....	84
Gambar 4. 28 Rancang Tampilan Halaman Daftar Harga Barang	85
Gambar 4. 29 Rancang Tampilan Halaman Purchase Order.....	86
Gambar 4. 30 Rancang Tampilan Halaman Detail Purchase Order	87
Gambar 4. 31 Rancang Tampilan Halaman Permintaan Barang.....	88
Gambar 4. 32 Rancang Tampilan Halaman Detail Permintaan Barang	89
Gambar 4. 33 Rancang Tampilan Halaman Menginput Bobot Rencana	90
Gambar 4. 34 Rancang Tampilan Halaman Week Clearance Report.....	91
Gambar 4. 35 Rancang Tampilan Halaman Rencana Anggaran Proyek.....	92
Gambar 4. 36 Rancang Tampilan Halaman Daftar Harga Barang	93
Gambar 4. 37 Rancang Tampilan Halaman Surat Permintaan Dana	94
Gambar 4. 38 Rancang Tampilan Halaman Permintaan Barang.....	95
Gambar 4. 39 Rancang Tampilan Halaman Purchase Order.....	96
Gambar 4. 40 Rancang Tampilan Halaman Supplier	97
Gambar 4. 41 Rancang Tampilan Halaman Laporan Mingguan.....	98
Gambar 4. 42 Rancang Tampilan Halaman Laporan Mingguan.....	99
Gambar 4. 43 Rancang Tampilan Halaman Earned Value Analysis	100
Gambar 4. 44 Rancang Tampilan Halaman Rencana Anggaran	101
Gambar 4. 45 Rancang Tampilan Halaman Week Clearance Report.....	102

Gambar 4. 46 Tampilan Halaman Login.....	107
Gambar 4. 47 Tampilan Halaman Rencana Anggaran	109
Gambar 4. 48 Tampilan Halaman Permintaan Barang.....	111
Gambar 4. 49 Tampilan Halaman Laporan Mingguan.....	113
Gambar 4. 50 Tampilan Halaman Permintaan Dana.....	115
Gambar 4. 51 Tampilan Halaman Purchase Order.....	117
Gambar 4. 52 Tampilan Halaman Daftar Harga Barang	119
Gambar 4. 53 Tampilan Halaman Rencana Anggaran	121
Gambar 4. 54 Tampilan Halaman Laporan Mingguan.....	123
Gambar 4. 55 Tampilan Halaman Permintaan Dana.....	125
Gambar 5. 1 Tampilan Halaman Login hak Akses Logistik	127
Gambar 5. 2 Tampilan Halaman Purchase Order Hak Akses Logistik	128
Gambar 5. 3 Tampilan Halaman Add Purchase Order Hak Akses Logistik.....	128
Gambar 5. 4 Tampilan Halaman Detail Purchase Order Hak Akses Logistik	129
Gambar 5. 5 Tampilan Halaman Permintaan Barang Hak Akses Logistik	129
Gambar 5. 6 Tampilan Halaman Detail Permintaan Barang Hak Akses Logistik.....	130
Gambar 5. 7 Tampilan Halaman Daftar Harga Barang Hak Akses Logistik.....	130
Gambar 5. 8 Tampilan Halaman Add Daftar Barang Hak Akses Logistik.....	131
Gambar 5. 9 Tampilan Halaman Permintaan Dana Hak Akses Logistik	131
Gambar 5. 10 Tampilan Halaman Add Permintaan Dana Hak Akses Logistik.....	132
Gambar 5. 11 Tampilan Halaman Login Hak Akses Site Manager	133
Gambar 5. 12 Tampilan Halaman Rencana Anggaran Hak Akses Site manager	134
Gambar 5. 13 Tampilan Halaman Add Rencana Anggaran Hak Akses Site manager	134
Gambar 5. 14 Tampilan Halaman Rencana Anggaran Hak Akses Site Manager.....	135
Gambar 5. 15 Tampilan Halaman Uraian Pekerjaan Hak Akses Site manager.....	135
Gambar 5. 16 Tampilan Halaman Bobot Rencana Hak Akses Site manager.....	136
Gambar 5. 17 Tampilan Halaman Permintaan barang Hak Akses Site Manager.....	137
Gambar 5. 18 Tampilan Halaman Permintaan Barang Hak Akses Site Manager	137
Gambar 5. 19 Tampilan Halaman Laporan Mingguan Hak Akses Site Manager	138
Gambar 5. 20 Tampilan Halaman Week Clearance Report Hak Akses Site Manager	138
Gambar 5. 21 Tampilan Halaman Add Permintaan Dana Hak Akses Site Manager.....	139
Gambar 5. 22 Tampilan Halaman Login Hak Akses Project Manager	140
Gambar 5. 23 Tampilan Halaman Rencana Anggaran Hak Akses Project Manager.....	140
Gambar 5. 24 Tampilan Halaman Laporan Mingguan Hak Akses Project Manager	141
Gambar 5. 25 Tampilan Halaman Earned Value Analysis Hak Akses Project Manager.	141
Gambar 5. 26 Tampilan Halaman Permintaan Dana Hak Akses Project Manager	148
Gambar 5. 27 Tampilan Halaman Permintaan Barang Hak Akses Project Manager	148

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Skenario Membuat Rencana Kegiatan	37
Tabel 4. 2 Skenario Mengajukan Permintaan Barang	38
Tabel 4. 3 Skenario Mengajukan Permintaan Dana	39
Tabel 4. 4 Skenario Membuat Laporan Mingguan.....	40
Tabel 4. 5 Skenario Usulan Login Hak Akses Logistik	50
Tabel 4. 6 Skenario Usulan Memproses Permintaan Barang Logistik.....	51
Tabel 4. 7 Skenario Usulan Membuat Dokumen Purchase Order Logistik	52
Tabel 4. 8 Skenario Usulan Membuat Surat Permintaan Dana Logistik.....	53
Tabel 4. 9 Skenario Usulan Logout Logistik	54
Tabel 4. 10 Skenario Usulan Login Site Manager	55
Tabel 4. 11 Skenario Usulan Membuat Rencana Kegiatan Site Manager.....	56
Tabel 4. 12 Skenario Usulan Mengajukan Permintaan Barang Site Manager	57
Tabel 4. 13 Skenario Usulan Mengajukan Permintaan Dana Site Manager	58
Tabel 4. 14 Skenario Usulan Membuat Laporan Mingguan Site Manager	59
Tabel 4. 15 Skenario Usulan Logout Site Manager	60
Tabel 4. 16 Skenario Usulan Login Hak Akses Project Manager	61
Tabel 4. 17 Skenario Usulan Menerima Rencana Kegiatan Project Manager	62
Tabel 4. 18 Skenario Usulan Menerima Laporan Mingguan Project manager	63
Tabel 4. 19 Skenario Usulan Menyetujui Permintaan Dana Project Manager.....	64
Tabel 4. 20 Skenario Usulan Menyetujui Permintaan Barang Project Manager.....	65
Tabel 4. 21 Skenario Usulan Logout Project Manager	66
Tabel 4. 22 Tabel Rencana Anggaran.....	104
Tabel 4. 23 Tabel Rencana Anggaran Detail.....	104
Tabel 4. 24 Tabel Laporan Mingguan	104
Tabel 4. 25 Tabel Uraian Kerja	105
Tabel 4. 26 Tabel Uraian Bobot	105
Tabel 4. 27 Tabel User	105
Tabel 4. 28 Tabel Bobot Rencana	105
Tabel 4. 29 Tabel Simpro Proyek.....	106
Tabel 5. 1 Budget Cost of Work Performance	142
Tabel 5. 2 Actual Cost Work Performance	142
Tabel 5. 3 Schedule Varians	143
Tabel 5. 4 Cost Variance	144
Tabel 5. 5 Schedule Performance Index.....	145
Tabel 5. 6 Cost Performance Index.....	145
Tabel 5. 7 Estimate To Complete	146
Tabel 5. 8 Estimate At Complete	147
Tabel 5. 9 Estimate To Schedule.....	147
Tabel 5. 10 Uji Coba Struktural	149
Tabel 5. 11 Uji Coba Fungsional.....	150

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permintaan Dana	159
Lampiran 2. Surat Permintaan Barang.....	160
Lampiran 3. Rencana Anggaran Proyek	161

